



Der Ausbau geht planmäßig voran

ZAUNAUFBAU AM SAMSTAG, DEN 26. OKTOBER

Wie angekündigt wollen wir den Zaun in Eigenarbeit verschrauben. **Freiwillige Helfer werden gebeten sich ab 9 Uhr am Solarfeld Waldweg einzufinden.** Bitte Schraubwerkzeug für Muttern 8, 10 und 12 mm mitbringen. Der Zaunbauer (Firma Vaupel) wird in den Tagen davor Pfosten setzen, an die die Zaunelemente angeschraubt werden müssen. Wenn alles gutgeht, werden wir schon einen guten Teil des Zauns erstellen können. Der Zaun wird allerdings noch nicht komplett errichtet, die Ostseite wird zunächst für die folgenden Bauarbeiten freibleiben.

BAUSTELLEN - WÄRMENETZ

Wenn Sie von einer Baustelle vor Ihrem Haus betroffen sind, rollen Sie die Mülltonnen bitte zum Ende der Absperrung, wo die Müllwagen anfahren können. Nach Möglichkeit sollen die Stellen von den Baufirmen markiert werden. **Bitte denken Sie daran, Ihre Mülltonnen verwechslungssicher zu markieren.** Die Abholbereiche können Sie auch bei den Arbeitern erfragen.


Die Zeitleiste wird regelmäßig aktualisiert, da sich die Planungen verschieben und ändern können. Momentaner Stand:

	Straße	von ca.	bis ca.
1	Riedweg/ Auf der Höll	befahrbar	
2	Lohweg	befahrbar	
3	Zum Hirschberg 6-9	befahrbar	
4a	Zum Hirschberg 1-3/		KW 43
4b	Auf dem Gerstenberg 2 - 10	KW 42	
4c	Auf dem Gerstenberg 14 - 16	nach Birkenweg	
5	Birkenweg 9,11,18,20	nach Birkenw. 1-10	
6	Buchenweg	befahrbar	
7	Birkenweg 1-10	KW 42	
8	MZH, Sporthaus	KW 41	
9	Auf der Höll-nord	zuletzt	

Kalenderwoche = KW KW 43 = 21. - 25. Okt.--- KW 44 = 28. Okt. – 1. Nov.

Der Lohweg wird für den Übergang der Hauptleitung in den Birkenweg zeitweise gesperrt werden müssen, d.h. in dieser Zeit muss man den Ortsteil von Westen her

erreichen. Der Birkenweg ist tagsüber wegen der Bauarbeiten nicht befahrbar und sollte abends nur von Anwohnern benutzt werden. Die Arbeiten werden außerhalb von Bracht-Süd demnächst in Bracht-Nord, wahrscheinlich im Wolfsgarten beginnend, fortgesetzt. Hier sind die Planungen aber noch nicht so weit fortgeschritten, dass schon Termine angegeben werden könnten.

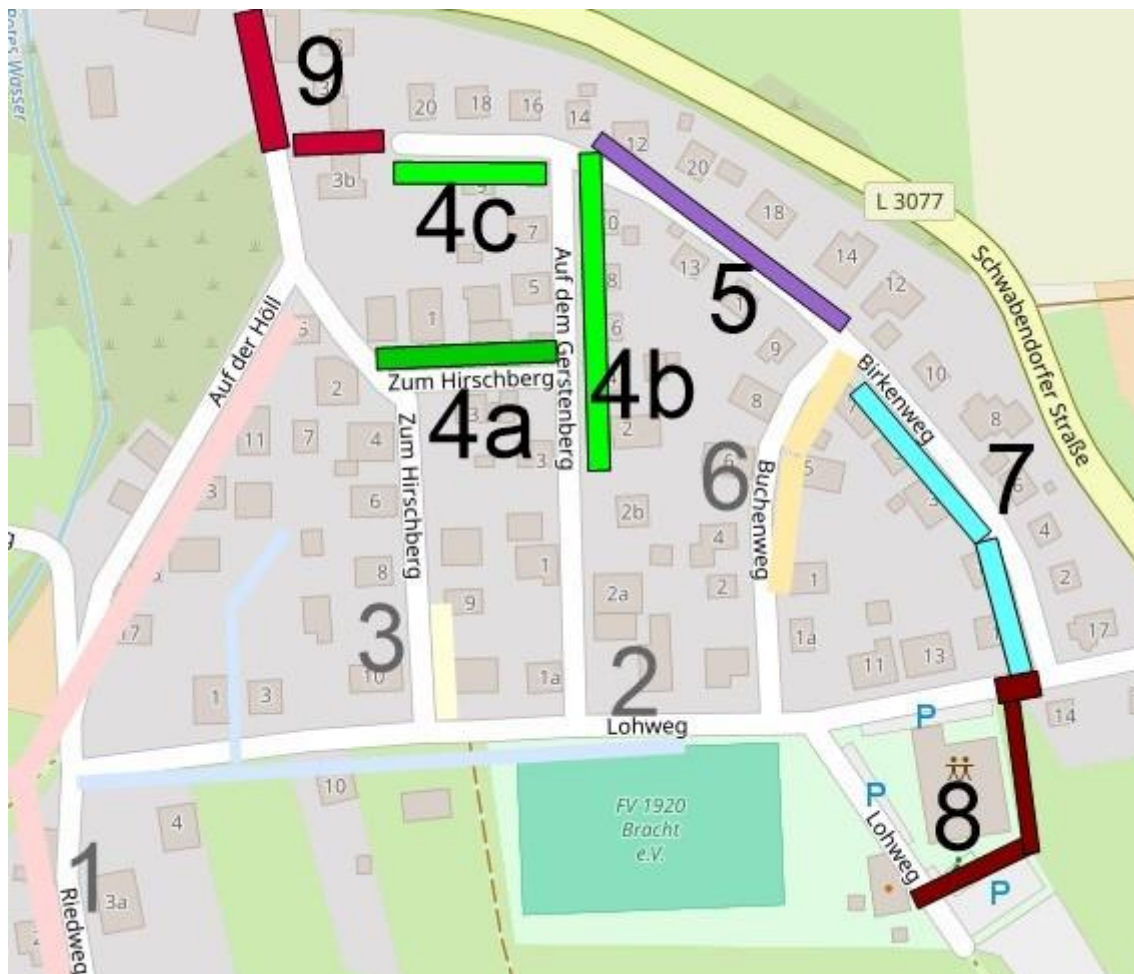

SOLARFELD WIRD BEGONNEN

Anfang November werden die ersten Materialien für das Solarfeld angeliefert und es wird sogleich mit dem Verlegen begonnen. Zunächst werden die Tiefbauarbeiten für die Verrohrung der Anlage gemacht. Es folgen dann die Rammungen für die Aufständigung der Solarkollektoren. Diese werden aber erst nach dem Winter im kommenden Frühjahr aufgebaut und hydraulisch mit der Anlage verbunden.

ENERGIEZENTRALE STARTET EBENFALLS BALD

Die Planungen für die Energiezentrale südlich des Speichers sind jetzt fertiggestellt, so dass in naher Zukunft mit dem Bau der Halle begonnen werden kann. Im Gegensatz zu ersten Planungen wird die Zentrale massiv gebaut und nicht mit Stahlwänden. Es fallen hierfür keine Mehrkosten an. Im Inneren der Energiezentrale werden dann die nötigen Komponenten für die Wärmeversorgung verbaut und alles miteinander verbunden.

HAUSBESUCHE IM VIERTEN BEZIRK (BRACHT-OST)

Donnerstag, 31. Oktober und Freitag 1. November werden die Planer von Viessmann zusammen mit der SWB den letzten Bezirk, Bracht-Siedlung begehen, um die Hauszugänge zu planen. Die Zeiträume für die einzelnen Begehungen werden mit den Hausbesitzern abgesprochen.

Der Arbeitskreis Solarwärme Bracht
