



PUFFERSPEICHER WURDE ANGELIEFERT




Der Pufferspeicher musste vor dem Aufrichten erst um 180 Grad horizontal gedreht werden.

Am 14. März wurde nach einem Nachttransport der große Pufferspeicher für unsere Anlage geliefert und in knapp drei Stunden aufgestellt. Der Pufferspeicher sammelt das Heizungswasser aus unseren verschiedenen Wärmequellen (Solarthermie - Erdbeckenspeicher, Wärmepumpen, Holzbrenner) in der nötigen Vorlauftemperatur und von dort aus wird es über das Verteilnetz an die Haushalte geleitet. Der Speicher fasst 200 Kubikmeter (200.000 Liter), ist 22 Meter hoch und hat einen Durchmesser von gut 3,5 m. Leer wiegt er ca. 25 Tonnen, mit Füllung an die 230 Tonnen. Daher steht er auch auf einem sehr stabilen Fundament. Inzwischen wurden auch die ersten Mauern der Energiezentrale hochgezogen. Damit ist erst mal die halbe Höhe erreicht. Das Richtfest für die Zentrale ist für den April geplant.

**SPERRUNG SCHÖNSTADTER STRASSE FÜR
DURCHGANGSVERKEHR AB 24. MÄRZ**

Nach langem Vorlauf gibt es jetzt die nötigen Genehmigungen und die Schönstadter Straße wird ab Montag, den 24. März 2025 für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Trassenverlegung erfolgt in drei Abschnitten, zunächst wird der südlichste Bereich bearbeitet. Es folgen dann die zwei weiteren Abschnitte, wie aus der Skizze ersichtlich. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich über die Monate März bis Mai

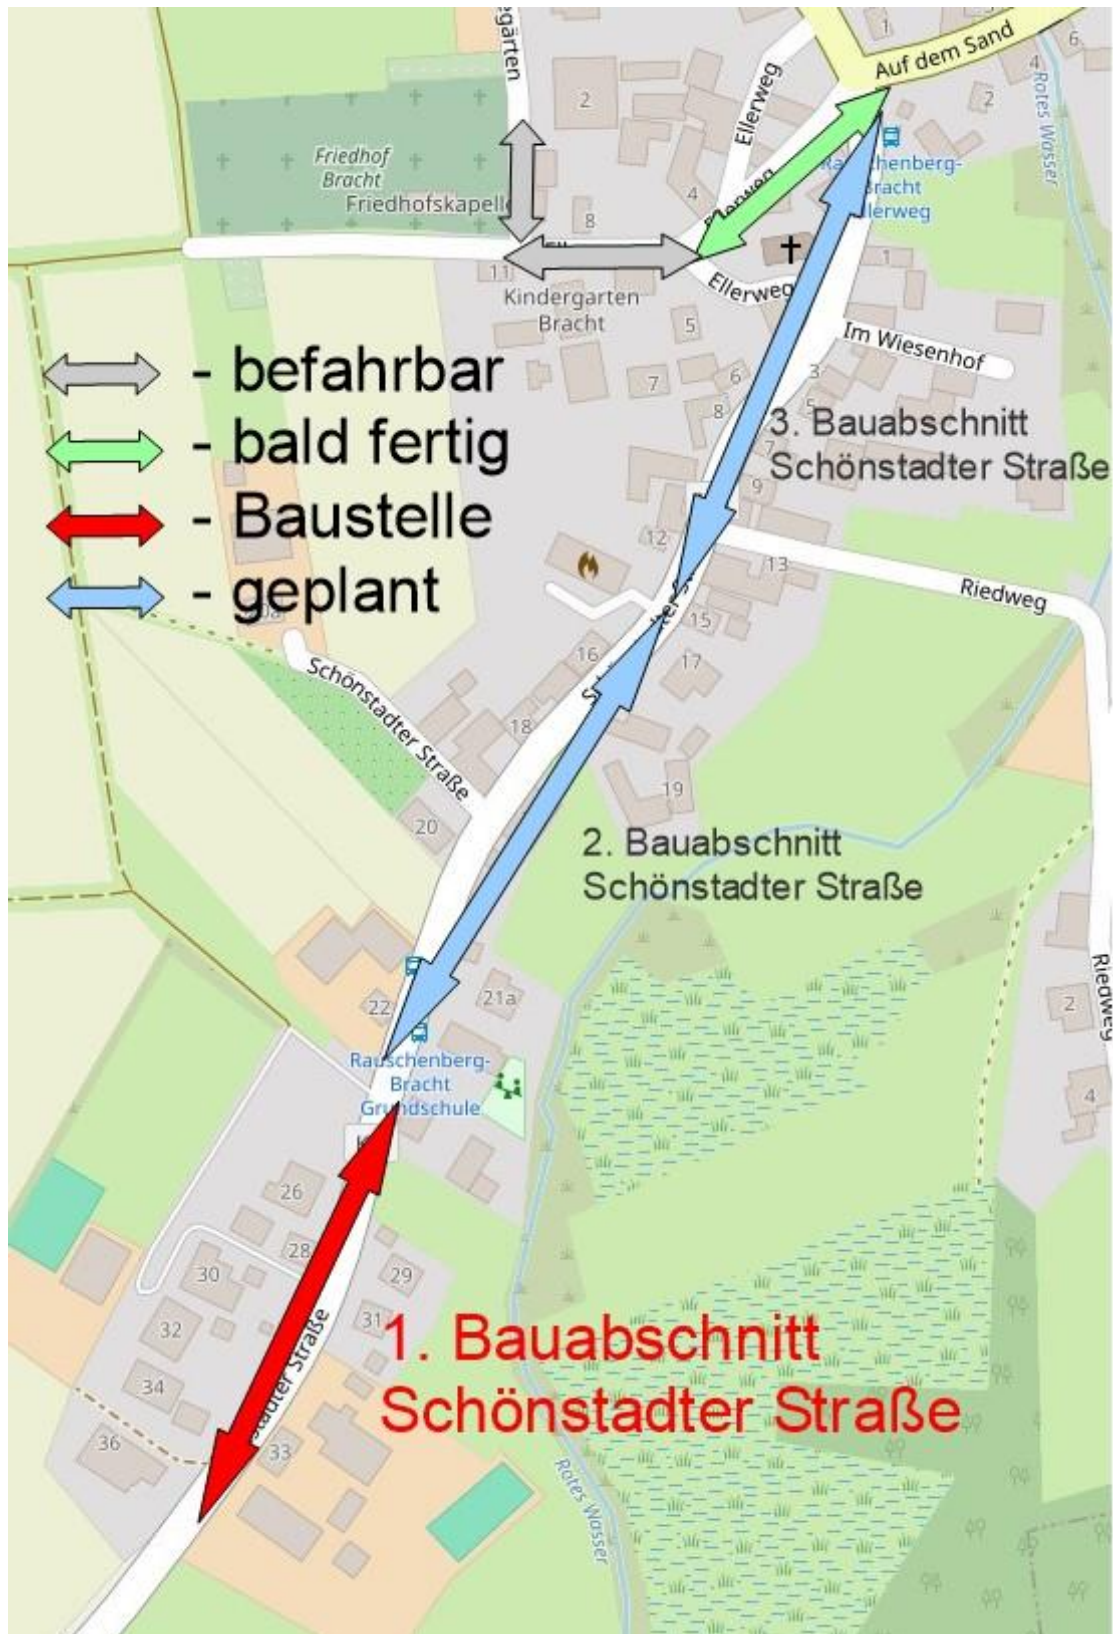

hinziehen. Für die Anwohner wird nach Möglichkeit versucht, die Zuwegungen in den Abendstunden freizuhalten. Es empfiehlt sich, geeignete Parkmöglichkeiten in der Umgebung zu suchen.

AUF DEM SAND/ ROSENTHALER STRAÙE

Erst wenn die Schönstadter Straße wieder durchgehend befahrbar ist, wird die Kreuzung gesperrt. Dazu gibt es später noch genauere Informationen. Die Trasse wird mit der aus dem Ellerweg kommenden verbunden und führt dann die Rosenthaler Straße hoch bis zum Grünen Weg. Außerdem wird sie dann über den Alten Weg, Auf dem Sand und Schwabendorfer Straße bis zum bestehenden Abzweig Auf der Höll geführt. Das alles soll bis zum August passieren.

ELLERWEG / WOLFGARTEN / BRACHT-SIEDLUNG



Der Speicher wurde mit zwei Kränen aufgerichtet, auf der Bodenplatte verankert und zuletzt an den Transportlöchern verschlossen. Er ist 20 cm stark gedämmt.

Die Bauarbeiten Pizzegärten/ Ellerweg sollen heute (21.3.2025) abgeschlossen sein. Daher beginnen jetzt die Arbeiten im Wolfsgarten, wo die Trasse am nördlichsten Ende beginnend über Im Wolfsgarten und Am roten Wasser nach unten geführt wird.

In Bracht-Siedlung haben die Bauarbeiten in der Mitte der Straße Am Bahndamm begonnen. Hier wird zunächst die Tieferlegung des Kanals quer durch den historischen Bahndamm zwischen Sudetenstraße und Am Bahndamm durchgeführt. Im Anschluss wird der westliche Bereich zwischen dem Durchbruch und der Waldstraße für die regulären Ver- und Entsorgungsleitungen erschlossen, bevor wir mit der Nahwärme diesen Bereich belegen können. Der grobe Zeithorizont hierfür ist September 2025. Der Bereich östlicher Bahndamm, Drosselweg und Sudetenstraße wird also

voraussichtlich nicht rechtzeitig vor dem Winter 2025/2026 angeschlossen werden können.

Informationen und vorausgegangene Artikel der RN unter solarwaerme-bracht.de

Der Arbeitskreis Solarwärme – Ralph Vogt
